



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

COMUNE DI MARSALA

(Provincia di Trapani)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI MARSALA

Livello Progettazione : PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Marsala
Responsabile Unico del Procedimento
Dir. Settore LL.PP.
ing. Luigi Palmeri

PROGETTISTA: Resp-Area edilizia privata
Ing. G. Giacalone

N° Tav.

E9

ELABORATO : CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA :


DATA : 02/12/2013

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CRONOPROGRAMMA

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1		Consegna dei lavori	01/06/2014	02/06/2014	1
2		Approntamento cantiere	03/06/2014	06/06/2014	3
3		Tracciamento	07/06/2014	09/06/2014	2
4		Scavi per fondazione e cavidotti	10/06/2014	15/06/2014	5
5		Realizzazione di opere di fondazione	16/06/2014	26/06/2014	10
6		Realizzazione dei cavidotti	26/06/2014	29/06/2014	3
7		Realizzazione strutture di sostegno	29/06/2014	29/07/2014	30
8		Installazione pannelli fotovoltaici ed inverter	29/07/2014	07/09/2014	40
9		Realizzazione e montaggio dei quadri elettrici	29/07/2014	18/08/2014	20
10		Realizzazione dei collegamenti elettrici	18/08/2014	07/09/2014	20
11		Ripristino dei luoghi	07/09/2014	27/09/2014	20
12		Allacciamenti, collaudo ed avvio impianto	27/09/2014	26/11/2014	60
13		Smobilizzazione del cantiere - fine lavori	26/11/2014	28/11/2014	2

DURATA (gg)

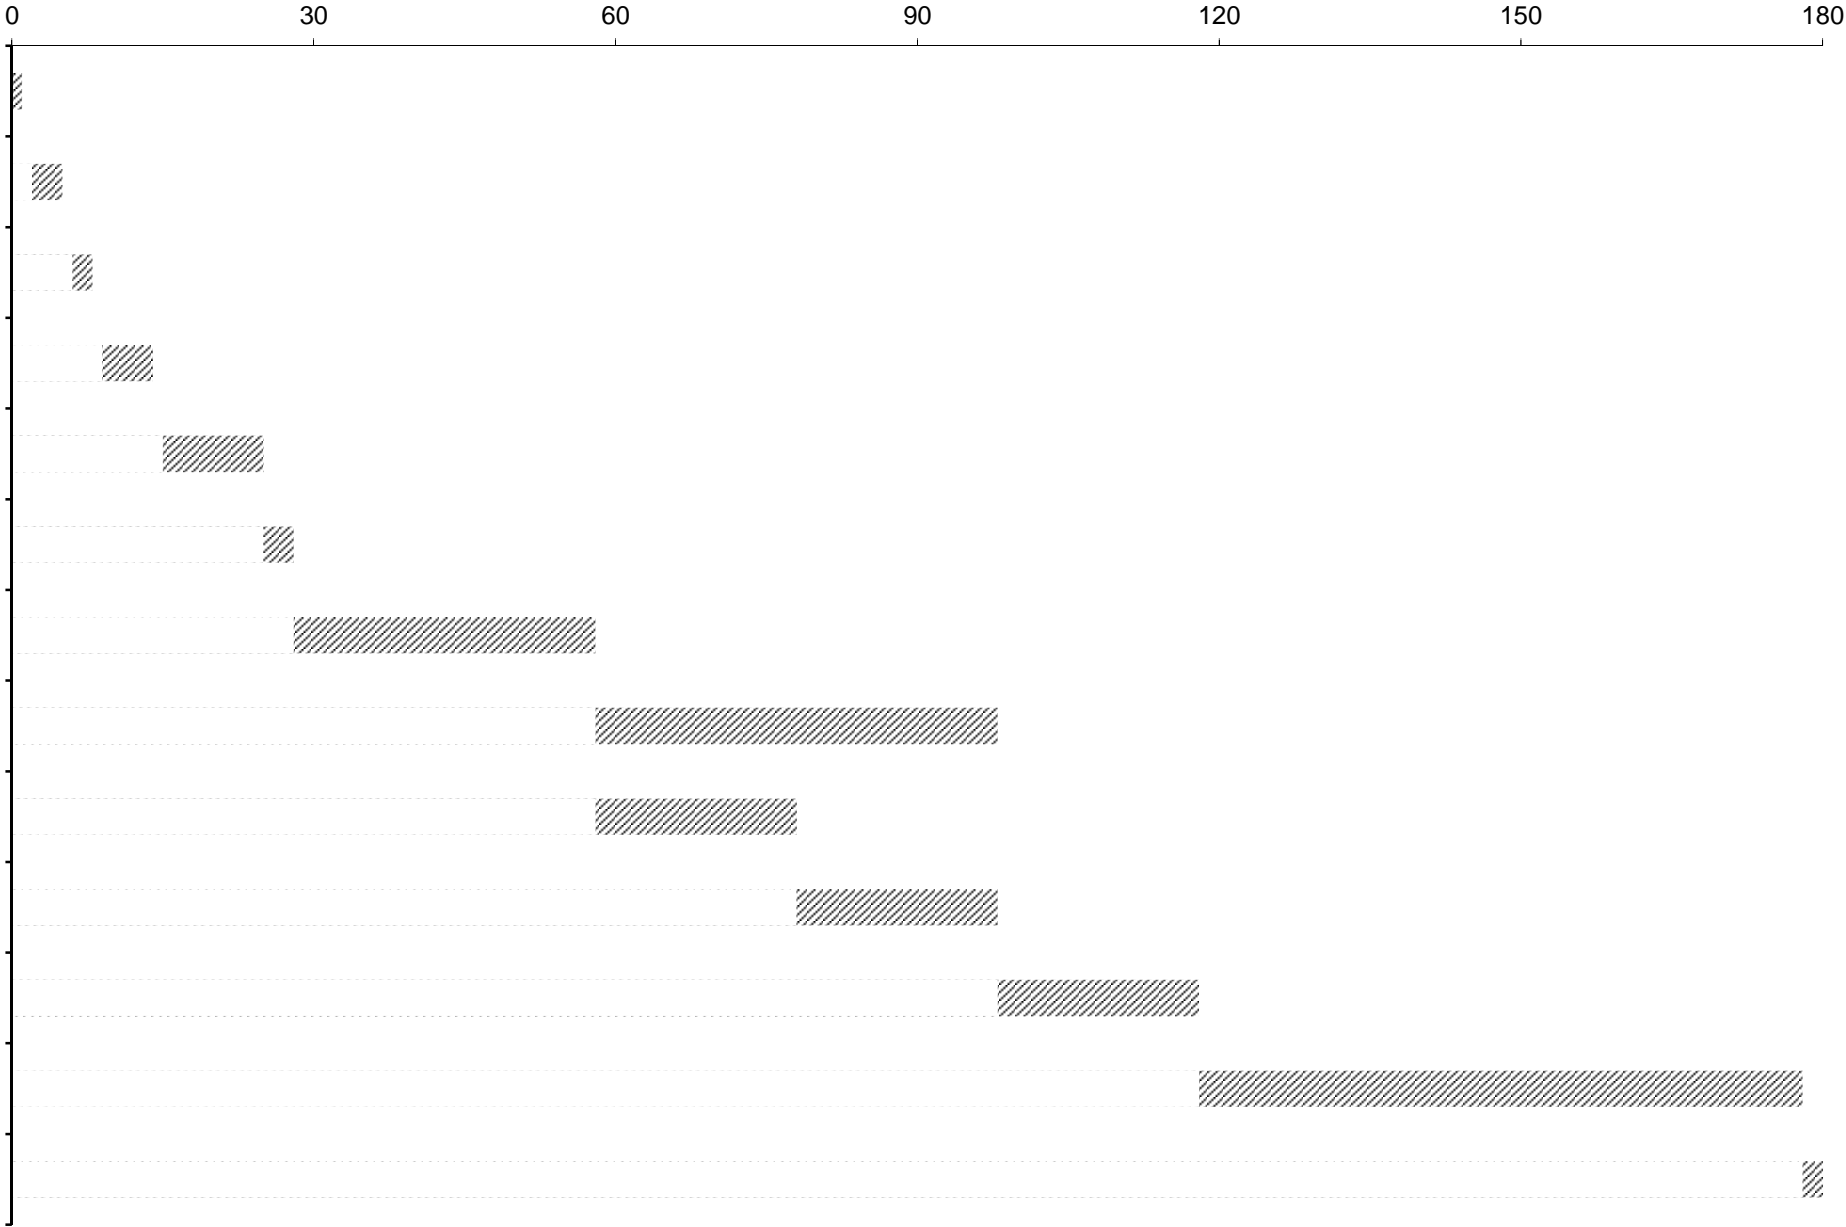

TC

180

gg.

naturali consecutivi

Fine lavori

180

gg
