

# COMUNE DI MARSALA

(Provincia di Trapani)

## PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCIDE DE GASPERI " SUCCURSALE TERRENOVE SITA NELLA C/DA TERRENOVE DEL COMUNE DI MARSALA

Livello Progettazione : PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Marsala  
Responsabile Unico del Procedimento  
Dir. Settore LL.PP.  
ing. Luigi Palmeri

PROGETTISTA: Resp-Area edilizia privata  
Ing. G. Giacalone

N° Tav.

**E9**

ELABORATO : CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA :


DATA : 02/12/2013

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CRONOPROGRAMMA

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1		Consegna dei lavori	01/06/2014	02/06/2014	1
2		Approntamento cantiere	03/06/2014	06/06/2014	3
3		Tracciamento	07/06/2014	09/06/2014	2
4		Scavi per fondazione e cavidotti	10/06/2014	15/06/2014	5
5		Realizzazione di opere di fondazione	16/06/2014	26/06/2014	10
6		Realizzazione dei cavidotti	26/06/2014	29/06/2014	3
7		Realizzazione strutture di sostegno	29/06/2014	29/07/2014	30
8		Installazione pannelli fotovoltaici ed inverter	29/07/2014	07/09/2014	40
9		Realizzazione e montaggio dei quadri elettrici	29/07/2014	18/08/2014	20
10		Realizzazione dei collegamenti elettrici	18/08/2014	07/09/2014	20
11		Ripristino dei luoghi	07/09/2014	27/09/2014	20
12		Allacciamenti, collaudo ed avvio impianto	27/09/2014	26/11/2014	60
13		Smobilizzazione del cantiere - fine lavori	26/11/2014	28/11/2014	2

DURATA (gg)

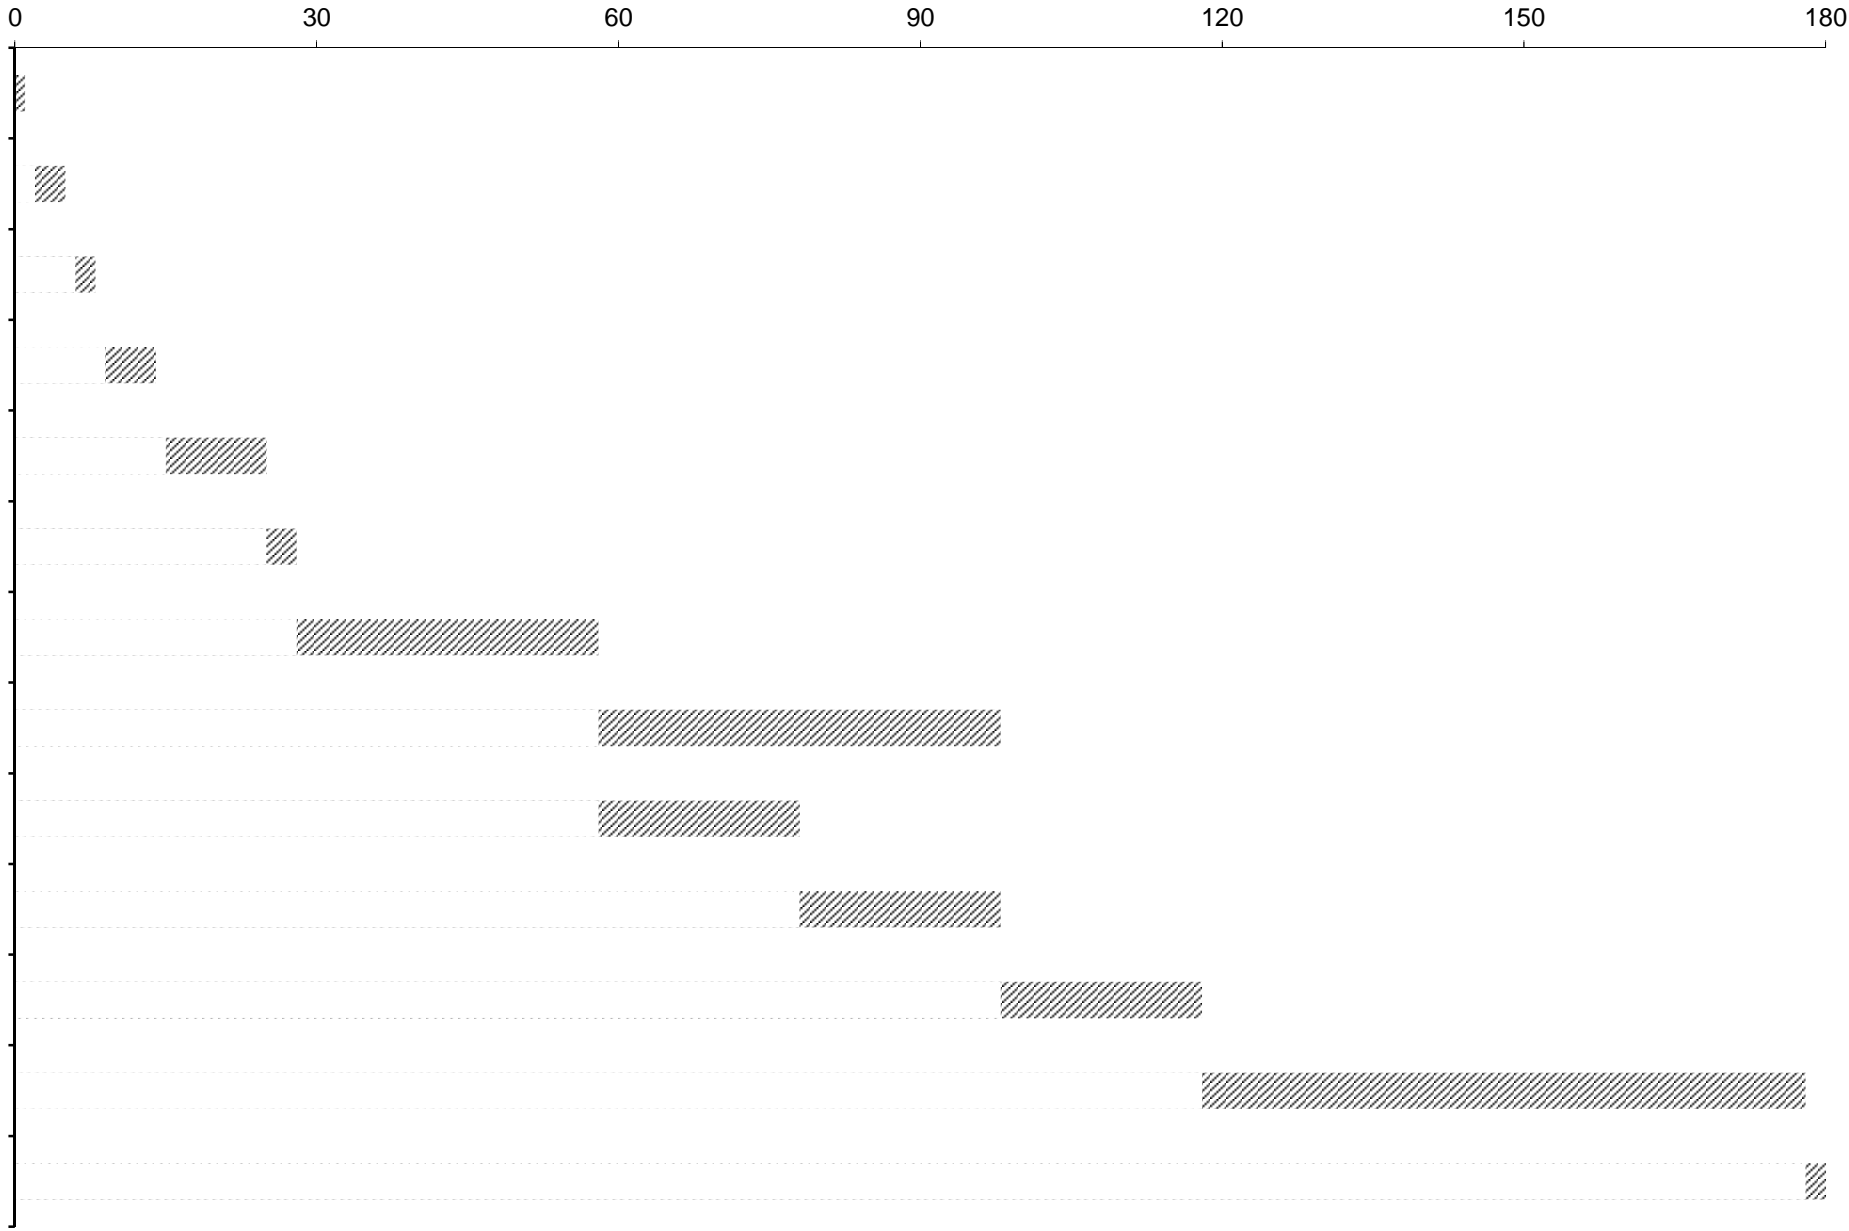

TC

180

gg.

naturali consecutivi

Fine lavori

180

gg
