

PROGRAMMA DEI LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA I = € 165.862,42

PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE i = € 27.000,00

TIPO DI LAVORO *OPERE EDILI*


CONDIZIONI CLIMATICHE *SFAVOREVOLI*

$n = I / i \times 1,74 =$ 11 mesi

$n^\circ =$ impianto di cantiere = 1 mese

$N =$ durata contrattuale lavori (da C.S.A.) = $n + n^\circ$ 12 mesi

$N =$ in cifra tonda 12 mesi

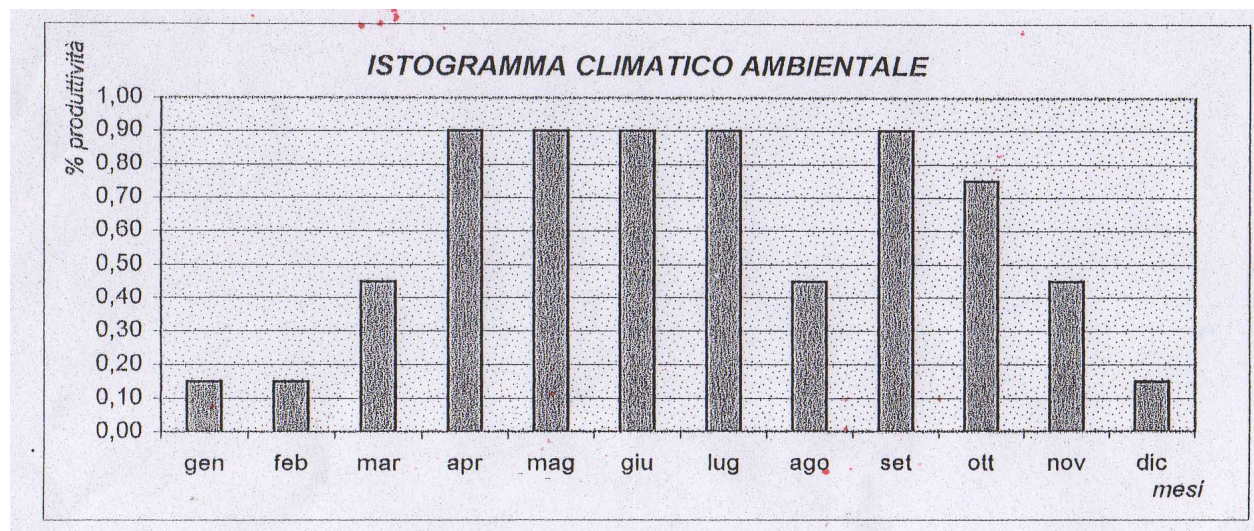

Gen	0,15
Feb	0,15
Mar	0,45
Apr	0,90
Mag	0,90
Giu	0,90
Lug	0,90
Ago	0,45
Set	0,90
Ott	0,75
Nov	0,45
Dic	0,15

Si ipotizza l'inizio dei lavori nel mese di gennaio 2014
